


Ilot Sacré – Planning v.8

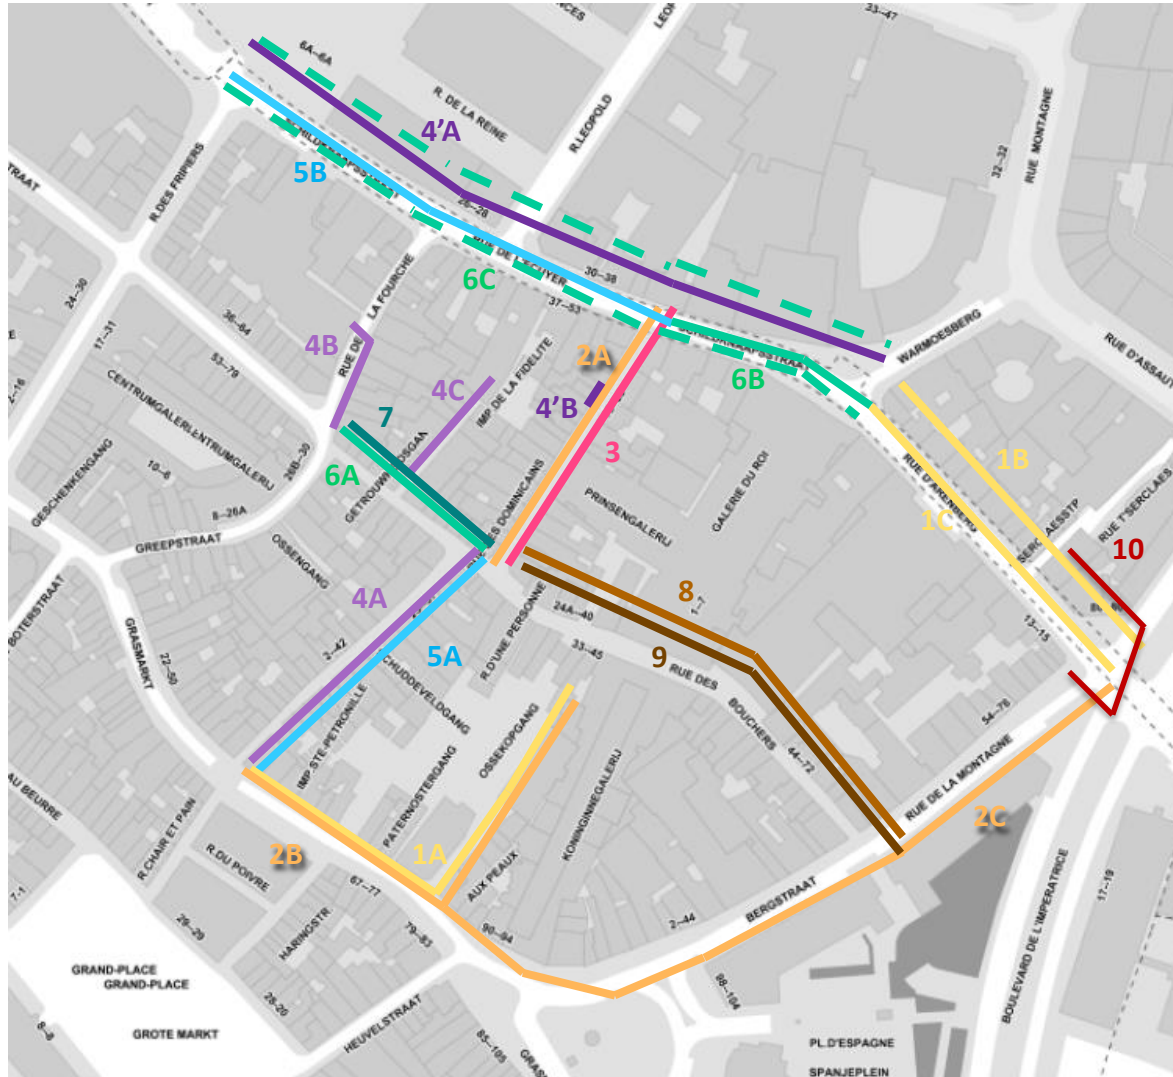

| | | | |
|---|-----------|--------------|--------------|
| Phase 1 | 56 jours | Lun 13/03/17 | Lun 29/05/17 |
| A - Rue Marché aux Herbes / Galika - Vivaqua | 56 jours | Lun 13/03/17 | Lun 29/05/17 |
| B - Arenberg PAIR - Sibelga | 18 jours | Lun 13/03/17 | Mer 5/04/17 |
| C - Arenberg IMPAIR - Sibelga | 35 jours | Jeu 6/04/17 | Mer 24/05/17 |
| Phase 2 | 55 jours | Lun 29/05/17 | Lun 14/08/17 |
| A - Dominicains - Vivaqua Assainissement | 55 jours | Mar 30/05/17 | Lun 14/08/17 |
| B - Herbes / Galika - Sibelga | 55 jours | Lun 29/05/17 | Lun 14/08/17 |
| C - Montagne - Sibelga | 55 jours | Lun 29/05/17 | Lun 14/08/17 |
| Phase 3 | 18 jours | Mer 16/08/17 | Ven 8/09/17 |
| Dominicains - Sibelga | 18 jours | Mer 16/08/17 | Ven 8/09/17 |
| Phase 4 | 48 jours | Lun 11/09/17 | Mer 15/11/17 |
| A - Petite rue des Bouchers - Vivaqua Assainissement | 41 jours | Lun 11/09/17 | Lun 6/11/17 |
| B - Fourche - Sibelga | 10 jours | Lun 11/09/17 | Ven 22/09/17 |
| C - Fidélité - Sibelga | 7 jours | Jeu 14/09/17 | Ven 22/09/17 |
| Phase 4' | 40 jours | Lun 25/09/17 | Ven 17/11/17 |
| A - Ecuyer PAIR - Sibelga | 14 jours | Lun 25/09/17 | Ven 13/10/17 |
| B - Dominicains (finalisation) - Vivaqua Assainissement | 9 jours | Mar 7/11/17 | Ven 17/11/17 |
| Phase 5 | 65 jours | Jeu 26/10/17 | Jeu 25/01/18 |
| A - Petite rue des Bouchers - Sibelga | 46 jours | Mer 22/11/17 | Ven 25/01/18 |
| B - Ecuyer IMPAIR 1 à 53 - Sibelga | 19 jours | Jeu 26/10/17 | Mer 22/11/17 |
| Phase 6 | 117 jours | Ven 13/10/17 | Lun 26/03/18 |
| A - Bouchers OUEST - Vivaqua Assainissement | 42 jours | Lun 29/01/18 | Mar 27/03/18 |
| B - Ecuyer IMPAIR 55 à 71 - Sibelga | 9 jours | Ven 13/10/17 | Jeu 26/10/17 |
| C - Ecuyer PAIR & IMPAIR - Sibelga EP | 10 jours | | |
| Phase 7 | 15 jours | Mer 28/03/18 | Mar 17/04/18 |
| Bouchers OUEST - Sibelga | 15 jours | Mer 28/03/18 | Mar 17/04/18 |
| Phase 8 | 44 jours | Mer 18/04/18 | Lun 18/06/18 |
| Bouchers EST - Vivaqua Assainissement | 44 jours | Mer 18/04/18 | Lun 18/06/18 |
| Phase 9 | 45 jours | Lun 22/10/18 | Ven 21/12/18 |
| Bouchers EST - Sibelga | 45 jours | Lun 22/10/18 | Lun 21/12/18 |
| Travaux de pose | 25 jours | Lun 22/10/18 | Ven 23/11/18 |
| Intégration, branchements, abandons | 20 jours | Lun 26/11/18 | Ven 21/12/18 |
| Phase 10 | 25 jours | Lun 17/09/18 | Ven 19/10/18 |
| Arenberg - Impératrice - Montagne - Sibelga | 25 jours | Lun 17/09/18 | Lun 19/10/18 |
| Travaux de pose | 20 jours | Lun 17/09/18 | Ven 12/10/18 |
| Intégration, branchements, abandons | 5 jours | Lun 15/10/18 | Ven 19/10/18 |

Ce phasage est fourni à titre indicatif et devra être confirmé phase par phase par l'équipe projet de Sibelga.
